



81	CONCRETO P/FALSO PISO e=4" 1:6 C:H	ju 3/3/16	lu 7/3/16	0%
82	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a
83	<b>MESAS DE CONCRETO PARA SS.HH Y COCINA</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a
84	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/MESAS DE CONCRETO	ju 3/3/16	vi 4/3/16	0%
85	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	vi 26/2/16	lu 29/2/16	0%
86	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	ma 1/3/16	mi 2/3/16	0%
87	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
88	<b>TIJERALES Y RETICULADOS</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
89	TIJERAL METALICO TM- 1, P/COBERTURA	vi 18/3/16	lu 21/3/16	4%
90	TIJERAL METALICO TM- 2, P/COBERTURA	ma 22/3/16	ma 22/3/16	4%
91	TIJERAL METALICO TM- 3, P/COBERTURA	mi 23/3/16	sá 26/3/16	4%
92	TIJERAL METALICO TM-4,P/COBERTURA	do 27/3/16	do 27/3/16	4%
93	IZAJE DE TIJERALES	lu 28/3/16	mi 30/3/16	0%
94	<b>CORREAS</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
95	CORREAS METALICAS 40X80X2MM	lu 28/3/16	ma 29/3/16	4%
96	SUJECION DE CORREAS TIPO S-1	mi 30/3/16	ju 31/3/16	4%
97	SUJECION DE CORREAS TIPO S-2	mi 30/3/16	ju 31/3/16	4%
98	<b>ANCLAJES</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
99	ANCLAJES METALICOS PARA TIJERALES TIPO D-1	mi 30/3/16	mi 30/3/16	0%
##	ANCLAJES METALICOS PARA TIJERALES TIPO D-2	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>COBERTURA</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>ma 5/4/16</b>	n/a
##	COBERTURA DE PLANCHA ALUZINC TI PREPINTADA, e=0.05MM	vi 1/4/16	lu 4/4/16	4%
##	CUMBRERA DENTADA ALUZINC E=0.50MM	vi 1/4/16	lu 4/4/16	0%
##	CONTORNOS DE FRISOS LATERALES CON ALUZINC E=0.50MM CON ANGULO	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	FRISOS FRONTALES DE SUPERBOARD	ma 5/4/16	ma 5/4/16	0%
##	<b>ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	CANAleta DE ALUZINC E=0.50MM (INC.GOTERA, SOPORTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	do 3/4/16	lu 4/4/16	0%
##	<b>VARIOS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>ju 7/4/16</b>	n/a
##	JUNTA DE AISLAMIENTO 1/2" CON TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO	ma 5/4/16	ju 7/4/16	0%
##	<b>CERCO PERIMETRICO DELIMITADOR E INGRESO PRINCIPAL</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>sá 9/4/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>sá 9/4/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ma 5/4/16	sá 9/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>vi 15/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	lu 11/4/16	vi 15/4/16	0%
##	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - P/HITOS	lu 11/4/16	vi 15/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	ma 5/4/16	sá 9/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	ma 5/4/16	ma 5/4/16	0%
##	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	CERCO DELIMITADOR C/POSTES DE MADERA, TUBO FºGº 1 1/4" Y ALAMBRE Gº Nº10	lu 11/4/16	mi 20/4/16	0%
##	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL DE MADERA PARA CERCO PERIMETRICO	ju 21/4/16	ju 21/4/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>vi 22/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA HITOS Y PUERTA DE INGRESO	vi 22/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>CERCO DE PROTECCION PARA ANTENA DE INTERNET</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>ma 5/4/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>ma 5/4/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ma 5/4/16	ma 5/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>do 10/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	do 10/4/16	do 10/4/16	0%
##	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>mi 13/4/16</b>	n/a
##	CERCO METALICO H=2.50M C/MALLA GALVANIZADA N°10 2"x2" CON TUBO FºGº 3" INC. 3 HILERAS DE ALAI	ma 12/4/16	mi 13/4/16	0%
##	PUERTA A=1.00M. H=2.00M. CON PERFILES DE ACERO NEGRO 1 1/2"x1 1/2"x3/16" CON MALLA GALVANIZA	mi 13/4/16	mi 13/4/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>ju 14/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO METALICO	ju 14/4/16	vi 15/4/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA CARPINTERIA METALICA EN CERCO	sá 16/4/16	do 17/4/16	0%
##	<b>ASTA DE BANDERA</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>lu 18/4/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	lu 18/4/16	lu 18/4/16	0%
##	<b>RELLENOS</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	ju 21/4/16	ju 21/4/16	0%
##	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	ju 21/4/16	ju 21/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>ma 19/4/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	n/a
##	<b>SOLADOS</b>	<b>ma 19/4/16</b>	<b>ma 19/4/16</b>	n/a
##	SOLADO C/MEZCLA 1:10 C:H E=4"	ma 19/4/16	ma 19/4/16	0%
##	<b>VEREDAS</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	ju 21/4/16	ju 21/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	ju 21/4/16	ju 21/4/16	0%
##	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	vi 22/4/16	vi 22/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>mi 20/4/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60-P/COLUMNAS	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	<b>CARPINTERIA METALICA</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	n/a
##	ASTA DE BANDERA CON TUBO FºGº DE 3" Y 2" H=6.20M HASTA ANCLAJE INC. RODON Y MASTIL	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	ASTA DE BANDERA CON TUBO FºGº DE 3" Y 2" H=5.20M HASTA ANCLAJE INC. RODON Y MASTIL	lu 18/4/16	ma 19/4/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	PINTURA ANTICORROSIVA EN ASTA	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA PEDESTAL DE ASTA	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>TANQUE ELEVADO (INCLUYE CUARTO DE EQUIPO)</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a




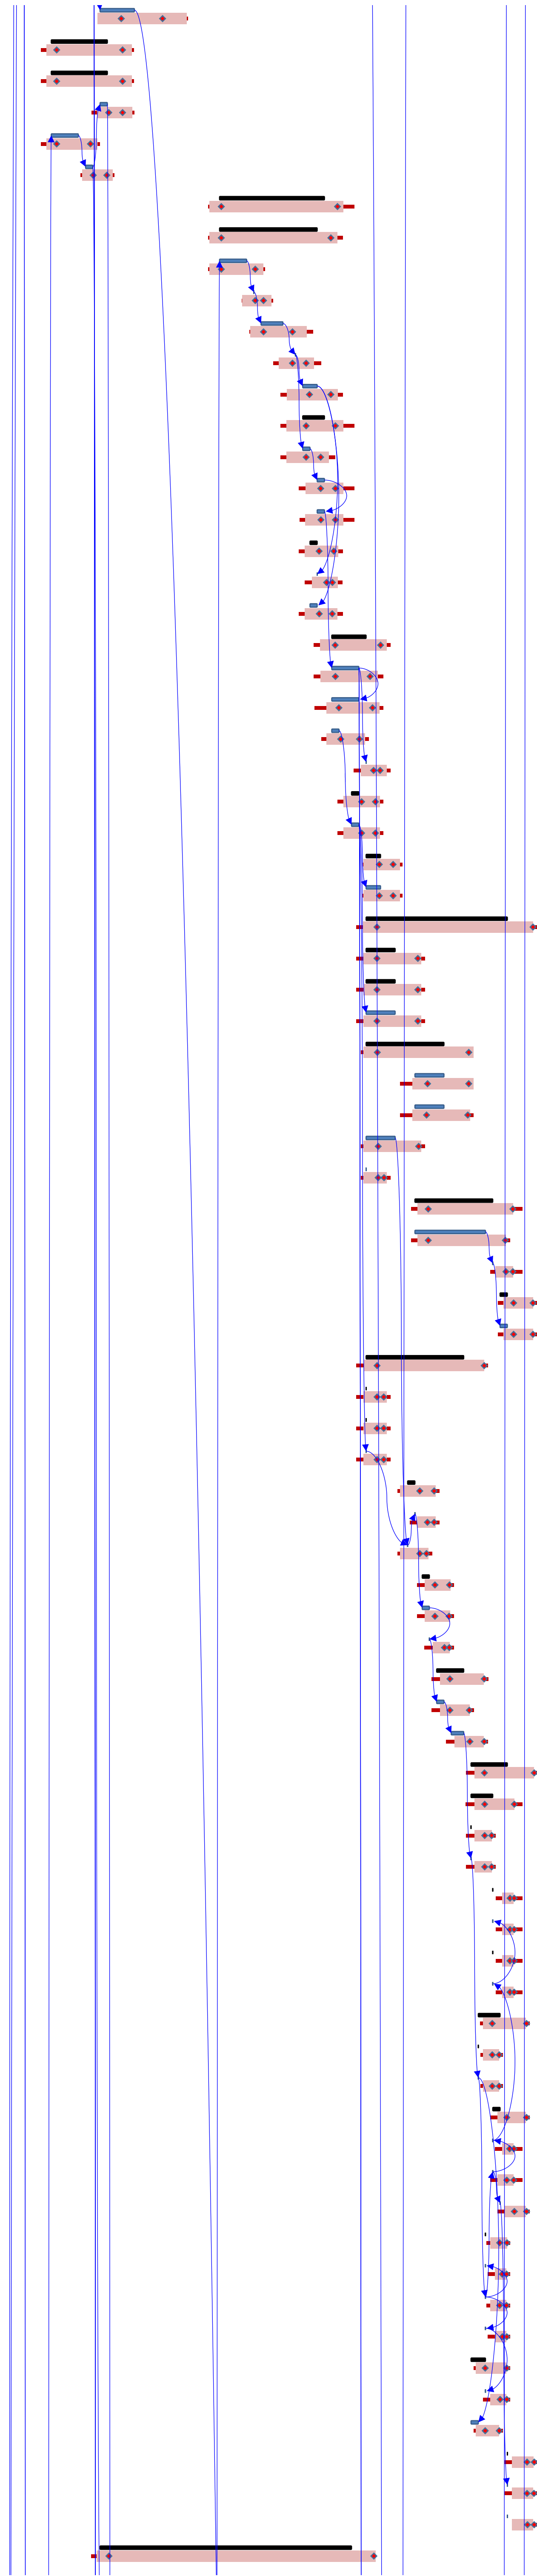

##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ju 3/3/16	vi 4/3/16	0%
##	<b>RELLENOS</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>do 6/3/16</b>	n/a
##	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	sá 5/3/16	do 6/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>do 6/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	n/a
##	<b>FALSO PISO</b>	<b>do 6/3/16</b>	<b>lu 7/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO EN FALSO PISO E=4"	do 6/3/16	lu 7/3/16	0%
##	<b>VEREDAS</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f <sub>c</sub> =175kg/cm <sup>2</sup> P/VEREDAS	mi 9/3/16	ju 10/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	ma 8/3/16	mi 9/3/16	0%
##	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1" P/VEREDAS	mi 9/3/16	ju 10/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	<b>ZAPATAS</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/ZAPATAS	ju 10/3/16	vi 11/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATAS	lu 7/3/16	ju 10/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	ju 10/3/16	vi 11/3/16	0%
##	<b>COLUMNAS</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/COLUMNAS	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	vi 11/3/16	lu 14/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	<b>VIGAS</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>vi 18/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/VIGAS	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	lu 14/3/16	ju 17/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	<b>LOSA MACIZAS</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/LOSA MACIZA	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>ALBAÑILERIA</b>	<b>do 6/3/16</b>	<b>ma 8/3/16</b>	n/a
##	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	do 6/3/16	ma 8/3/16	0%
##	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	lu 14/3/16	mi 16/3/16	0%
##	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	mi 16/3/16	vi 18/3/16	0%
##	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>CIELORRASO</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	<b>CIELORRASO CON MEZCLA</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	sá 19/3/16	lu 21/3/16	0%
##	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	<b>PISOS DE CONCRETO</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN CUADRADOS S=1%	lu 21/3/16	ma 22/3/16	0%
##	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a
##	<b>ZOCALO</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a
##	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	ma 22/3/16	mi 23/3/16	0%
##	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	n/a
##	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	ju 10/3/16	sá 12/3/16	0%
##	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	<b>CERRAJERIA</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	<b>OTROS</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	<b>TANQUE ELEVADO</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	TANQUE DE AGUA PREFABRICADO POLIETILENO 2.5 M3 INC. ACCESORIOS	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO D=1 1/2" Y BARANDA DE TUBO DE FIERRO D=1 1/2"	ma 22/3/16	mi 23/3/16	0%
##	BARANDA DE PROTECCION CON TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	mi 23/3/16	ju 24/3/16	0%
##	ACCESORIOS DE SUJECION DE TANQUE CON TENSORES Y FAJAS/CABLES	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	TUBERIA PVC SAL Ø 2"	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø2"	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	TEE PVC SAL Ø2"	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	TEE PVC SAP Ø1"	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>VALVULAS</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	n/a
##	VALVULA CHECK DE 1"	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%
##	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2"	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%
##	<b>ABRAZADERAS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1"	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1 1/2"	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%

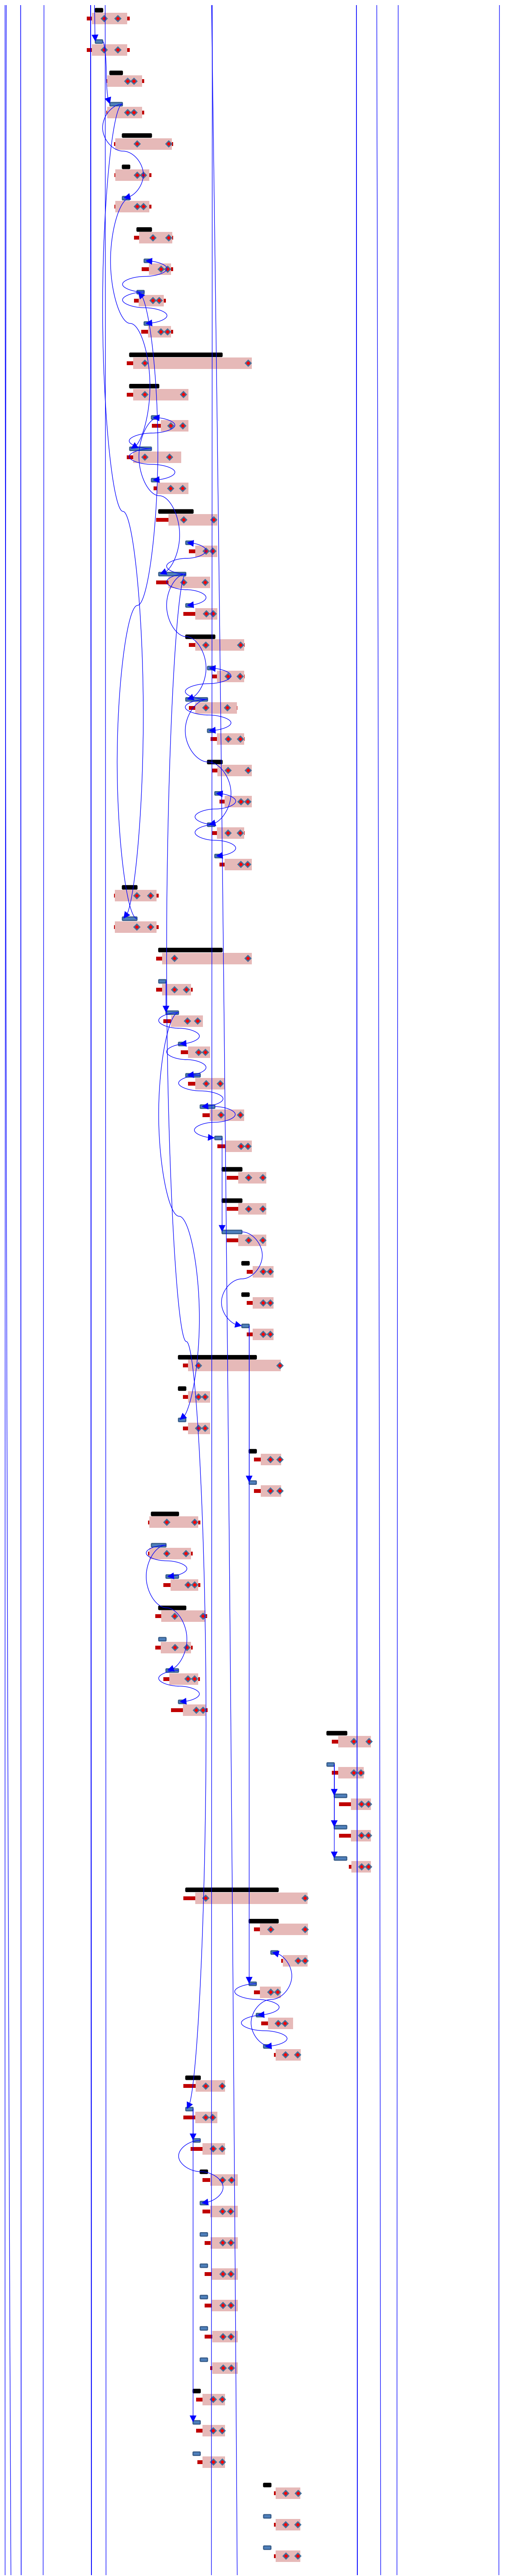


##	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2"	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>SERVICIO HIGIENICO Y LAVADERO EXTERIOR</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>ma 8/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ma 8/3/16	ma 8/3/16	0%
##	<b>RELLENOS</b>	<b>mi 9/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	n/a
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	mi 9/3/16	mi 9/3/16	0%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%
##	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%
##	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	<b>CIMENTOS CORRIDOS</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C.H + 30% P.G ØMAX. 6"	ju 10/3/16	ju 10/3/16	0%
##	<b>SOBRECIMIENTO</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C.H + 25% P.M ØMAX. 3"	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%
##	<b>VEREDAS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO F <sub>c</sub> =175kg/cm <sup>2</sup> P/VEREDAS	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	<b>FALSO PISO</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>sá 12/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO FALSO PISO e=4" 1:6 C.H	sá 12/3/16	sá 12/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	<b>VIGAS</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO F <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/VIGAS	ma 15/3/16	ma 15/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	lu 14/3/16	lu 14/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60-P/VIGAS	lu 14/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>LOSA MACISAS</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>vi 18/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO F <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/LOSA MACIZA	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>LAVADERO</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO F <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> P/LAVADERO	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL/LAVADERO	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO F <sub>y</sub> =4,200kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	ju 17/3/16	vi 18/3/16	0%
##	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	n/a
##	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	TARRAJEO EN DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	lu 21/3/16	ma 22/3/16	0%
##	<b>CIELORRASO</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	<b>CIELORRASO CON MEZCLA</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	ma 22/3/16	ju 24/3/16	0%
##	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	<b>CONTRAPISOS</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	CONTRAPISO E=4 CM BASE 3 CM. MEZC. C:H 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA C:A 1:2 (ACABADO SEMIPULIDO)	mi 23/3/16	ju 24/3/16	0%
##	<b>PISOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	PISO CERAMICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO E=7.2mm	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	<b>ZOCALOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 cm	ju 24/3/16	ju 24/3/16	0%
##	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACIZA C/MARCO DE MADERA 2"x6" C/TOPE DE ACERO DE MEDIA LUNA	ma 22/3/16	ju 24/3/16	0%
##	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>CERRAJERIA</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	ma 22/3/16	mi 23/3/16	0%
##	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	mi 23/3/16	ju 24/3/16	0%
##	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>lu 28/3/16</b>	n/a
##	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%
##	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	INODORO ONE PICE LIBERTY	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%
##	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%
##	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	lu 28/3/16	ma 29/3/16	0%
##	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	GRIFERIA DE BRONCE PESADO CROMADO SIMPLE TIPO ESFERICA P/LAVATORIO	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a

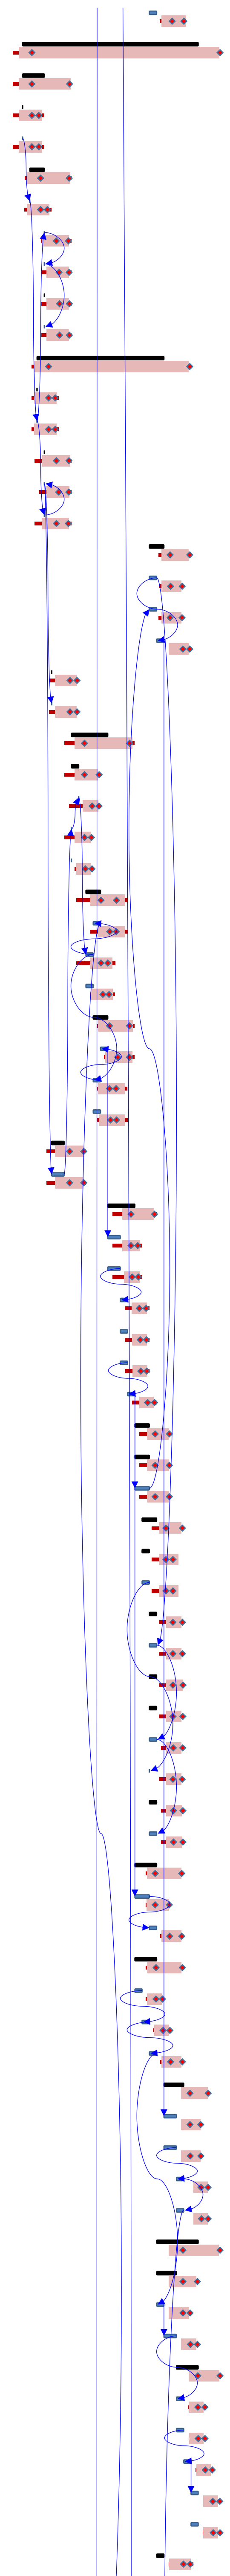




##	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	<b>INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>lu 28/3/16</b>	n/a
##	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%
##	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	<b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE RED DE AGUA</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	TEE PVC SAP 90°xØ3/4"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	TEE PVC SAP 90° x Ø1/2	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 1.1/2" A 1"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>VALVULAS DE RED DE AGUA</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	n/a
##	VALVULA DE PASO 1/2"	vi 18/3/16	sá 19/3/16	0%
##	<b>DESAGÜE Y VENTILACION</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	<b>SALIDAS DE DESAGUE</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	<b>REDES COLECTORAS INTERIORES DE DESAGUE</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS DESAGÜE</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	YEE PVC SAL Ø4"x2"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	CODO PVC SAL 45° x Ø4"	sá 19/3/16	lu 21/3/16	0%
##	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø4"	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a
##	TRAMPA "P" PVC SAL Ø2	do 20/3/16	lu 21/3/16	0%
##	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	lu 21/3/16	ma 22/3/16	0%
##	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	ma 22/3/16	mi 23/3/16	0%
##	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	ma 22/3/16	mi 23/3/16	0%
##	<b>TENDAL</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	lu 28/3/16	ma 29/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	<b>BASES DE CONCRETO</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	mi 30/3/16	ju 31/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>ESTRUCTURA DE MADERA</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	<b>COLUMNAS-VIGAS</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	PARANTES Y TRAVESAÑO DE MADERA NOGAL 4"x4"	mi 30/3/16	ju 31/3/16	0%
##	<b>DADOS DE CONCRETO PARA POSTE FOTOVOLTAICO</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>vi 1/4/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ju 31/3/16	vi 1/4/16	0%
##	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>sá 2/4/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>sá 2/4/16</b>	n/a
##	<b>BASES DE CONCRETO</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>sá 2/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	<b>CUNETA PERIMETRAL Y COLUMNETA DE BAJADA</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>sá 16/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>sá 16/4/16</b>	<b>lu 18/4/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA CUNETA PERIMETRAL	sá 16/4/16	lu 18/4/16	0%
##	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	lu 18/4/16	ju 21/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CUNETAS	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUNETAS	lu 18/4/16	mi 27/4/16	0%
##	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	ma 19/4/16	mi 20/4/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>ma 8/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CUNETAS DE BAJADA	ma 8/3/16	ma 8/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CULUMNETAS DE BAJADA	lu 7/3/16	lu 7/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	sá 5/3/16	sá 5/3/16	0%
##	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>sá 12/3/16</b>	n/a
##	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. CA 1:5, E=1.0 CM	ma 8/3/16	sá 12/3/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	n/a
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS DE BAJADA Y TUBERIA PLUVIAL COLOR BLANCO HL	mi 16/3/16	mi 16/3/16	0%
##	<b>OTROS</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	<b>REJILLAS</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	REJILLA TIPO PARRILLA DE PVC PESADO PARA CUNETAS	ma 22/3/16	sá 26/3/16	0%

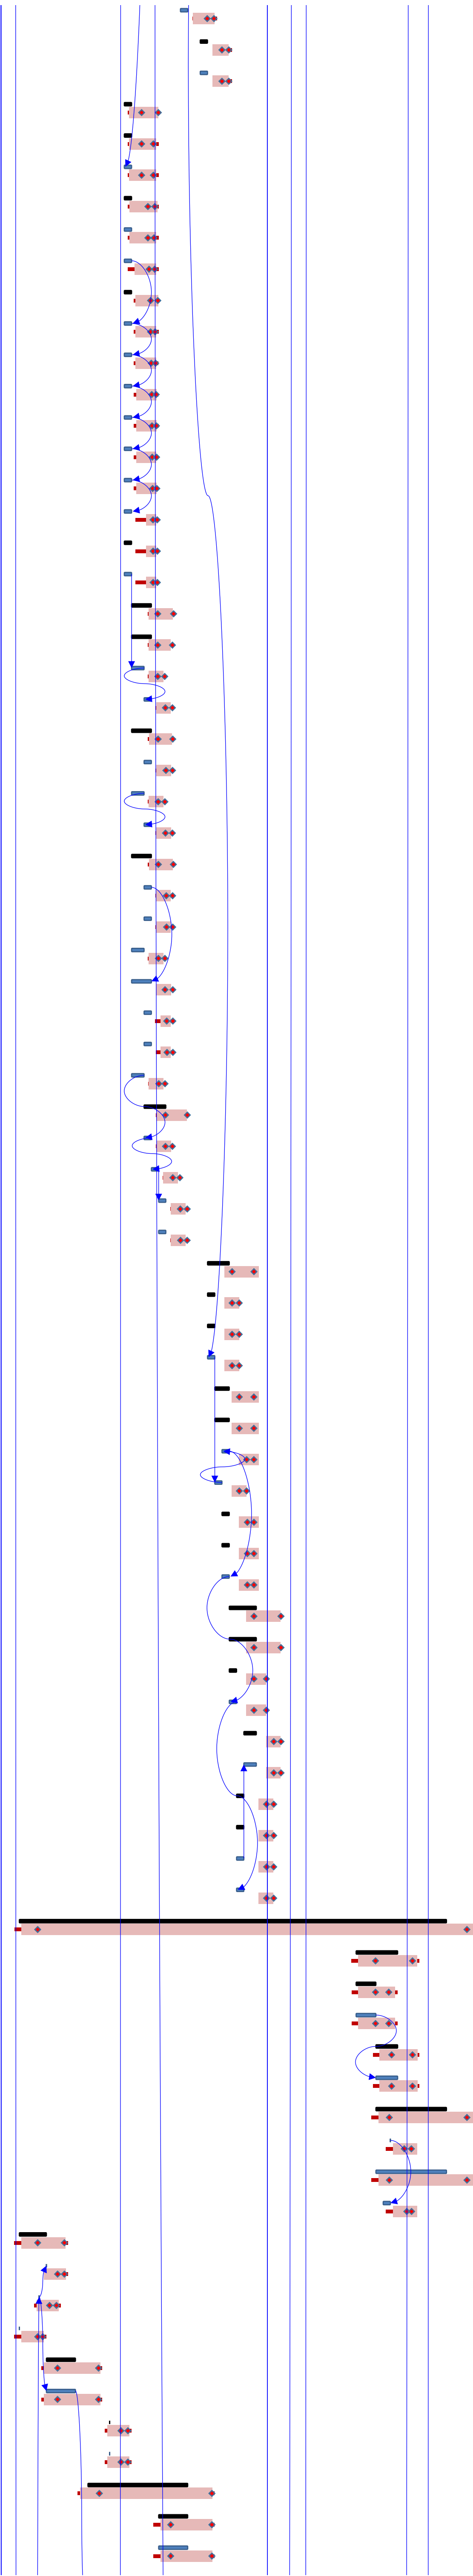


##	ACCESORIOS SANITARIOS DE COLUMNETAS DE BAJADA	do 13/3/16	ma 15/3/16	n/a
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP Ø4 C-5	ma 15/3/16	ma 15/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø4"	do 13/3/16	ma 15/3/16	0%
##	MUROS CORTAVIENTOS	vi 8/4/16	vi 29/4/16	n/a
##	MOVIMIENTO DE TIERRAS	do 10/4/16	ma 12/4/16	n/a
##	EXCAVACIONES	do 10/4/16	do 10/4/16	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	do 10/4/16	do 10/4/16	0%
##	RELLENOS	lu 11/4/16	lu 11/4/16	n/a
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0%
##	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	ma 12/4/16	ma 12/4/16	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0%
##	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	vi 8/4/16	mi 13/4/16	n/a
##	CIMENTOS CORRIDOS	lu 11/4/16	lu 11/4/16	n/a
##	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C.H + 30% P.G ØMAX. 6"	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0%
##	SOBRECIMIENTO	vi 8/4/16	mi 13/4/16	n/a
##	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C.H + 25% P.M ØMAX. 3"	mi 13/4/16	mi 13/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/SOBRECIMIENTO (MECHAS)	vi 8/4/16	vi 8/4/16	0%
##	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	lu 11/4/16	vi 29/4/16	n/a
##	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	lu 11/4/16	ma 19/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=kg/cm2 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	ma 19/4/16	ma 19/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	do 17/4/16	lu 18/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0%
##	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	ma 12/4/16	vi 22/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=210kg/cm2 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	vi 22/4/16	vi 22/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	mi 20/4/16	ju 21/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0%
##	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	ju 14/4/16	ju 14/4/16	n/a
##	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	ju 14/4/16	ju 14/4/16	0%
##	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	sá 23/4/16	ma 26/4/16	n/a
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 23/4/16	do 24/4/16	0%
##	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	lu 25/4/16	ma 26/4/16	0%
##	CONTRAZOCALOS	mi 27/4/16	mi 27/4/16	n/a
##	CONTRAZOCALOS DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.20m	mi 27/4/16	mi 27/4/16	0%
##	PINTURA	ju 28/4/16	vi 29/4/16	n/a
##	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS ZOCALO COLOR ROJO TEJA H=0.20m	vi 29/4/16	vi 29/4/16	0%
##	BANCA DE CONCRETO EN PATIO	mi 13/4/16	do 24/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=210kg/cm2 P/BANCA EN PATIO	do 24/4/16	do 24/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BANCA EN PATIO	vi 22/4/16	sá 23/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4200kg/cm2 GRADO 60-P/BANCA EN PATIO	mi 13/4/16	mi 13/4/16	0%
##	POZO DE CAPTACION Y CASETA DE BOMBEO	ma 23/2/16	ma 3/5/16	n/a
##	TRABAJOS PRELIMINARES	lu 29/2/16	ma 1/3/16	n/a
##	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	lu 29/2/16	lu 29/2/16	13%
##	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	ma 1/3/16	ma 1/3/16	13%
##	MOVIMIENTO DE TIERRAS	mi 2/3/16	sá 5/3/16	n/a
##	EXCAVACIONES	mi 2/3/16	sá 5/3/16	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	mi 2/3/16	sá 5/3/16	13%
##	RELLENOS	do 6/3/16	do 20/3/16	n/a
##	REFINE Y COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	do 6/3/16	lu 7/3/16	13%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO MENOR	ma 8/3/16	ma 8/3/16	13%
##	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø3/4"	mi 9/3/16	mi 9/3/16	13%
##	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø1/4 "	mi 9/3/16	mi 9/3/16	13%
##	RELLENO CON GRAVA Y ARENA SELECCIONADA	do 13/3/16	do 20/3/16	0%
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	mi 9/3/16	do 13/3/16	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	mi 9/3/16	do 13/3/16	0%
##	TABLADO ESTACADO PARA EXCAVACIONES DE POZO	lu 29/2/16	sá 5/3/16	n/a
##	ENTIBADO DE POZO	lu 29/2/16	sá 5/3/16	13%
##	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	mi 23/3/16	ma 12/4/16	n/a
##	CIMENTOS CORRIDOS	mi 23/3/16	sá 26/3/16	n/a
##	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO C:A - 1:8	mi 23/3/16	sá 26/3/16	13%
##	SOBRECIMENTOS	do 27/3/16	vi 1/4/16	n/a
##	CONCRETO P/SOBRECIMENTOS 1:6 C:H	mi 30/3/16	vi 1/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	do 27/3/16	ma 29/3/16	0%
##	VEREDAS	do 10/4/16	ma 12/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=175kg/cm2	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	do 10/4/16	lu 11/4/16	0%
##	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2 " P/VEREDAS	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0%
##	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	ju 10/3/16	do 10/4/16	n/a
##	ANILLOS DE CONCRETO CIEGO	ju 10/3/16	sá 19/3/16	n/a
##	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 P/ANILLOS	sá 12/3/16	sá 19/3/16	13%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANILLOS	vi 11/3/16	vi 18/3/16	13%
##	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	ju 10/3/16	ju 17/3/16	13%
##	COLUMNAS	mi 23/3/16	sá 2/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 P/COLUMNAS	vi 1/4/16	sá 2/4/16	13%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	lu 28/3/16	ju 31/3/16	13%
##	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	mi 23/3/16	ju 24/3/16	13%
##	VIGAS	do 3/4/16	sá 9/4/16	n/a
##	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 P/VIGAS	vi 8/4/16	sá 9/4/16	13%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	ma 5/4/16	ju 7/4/16	13%
##	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	do 3/4/16	lu 4/4/16	13%

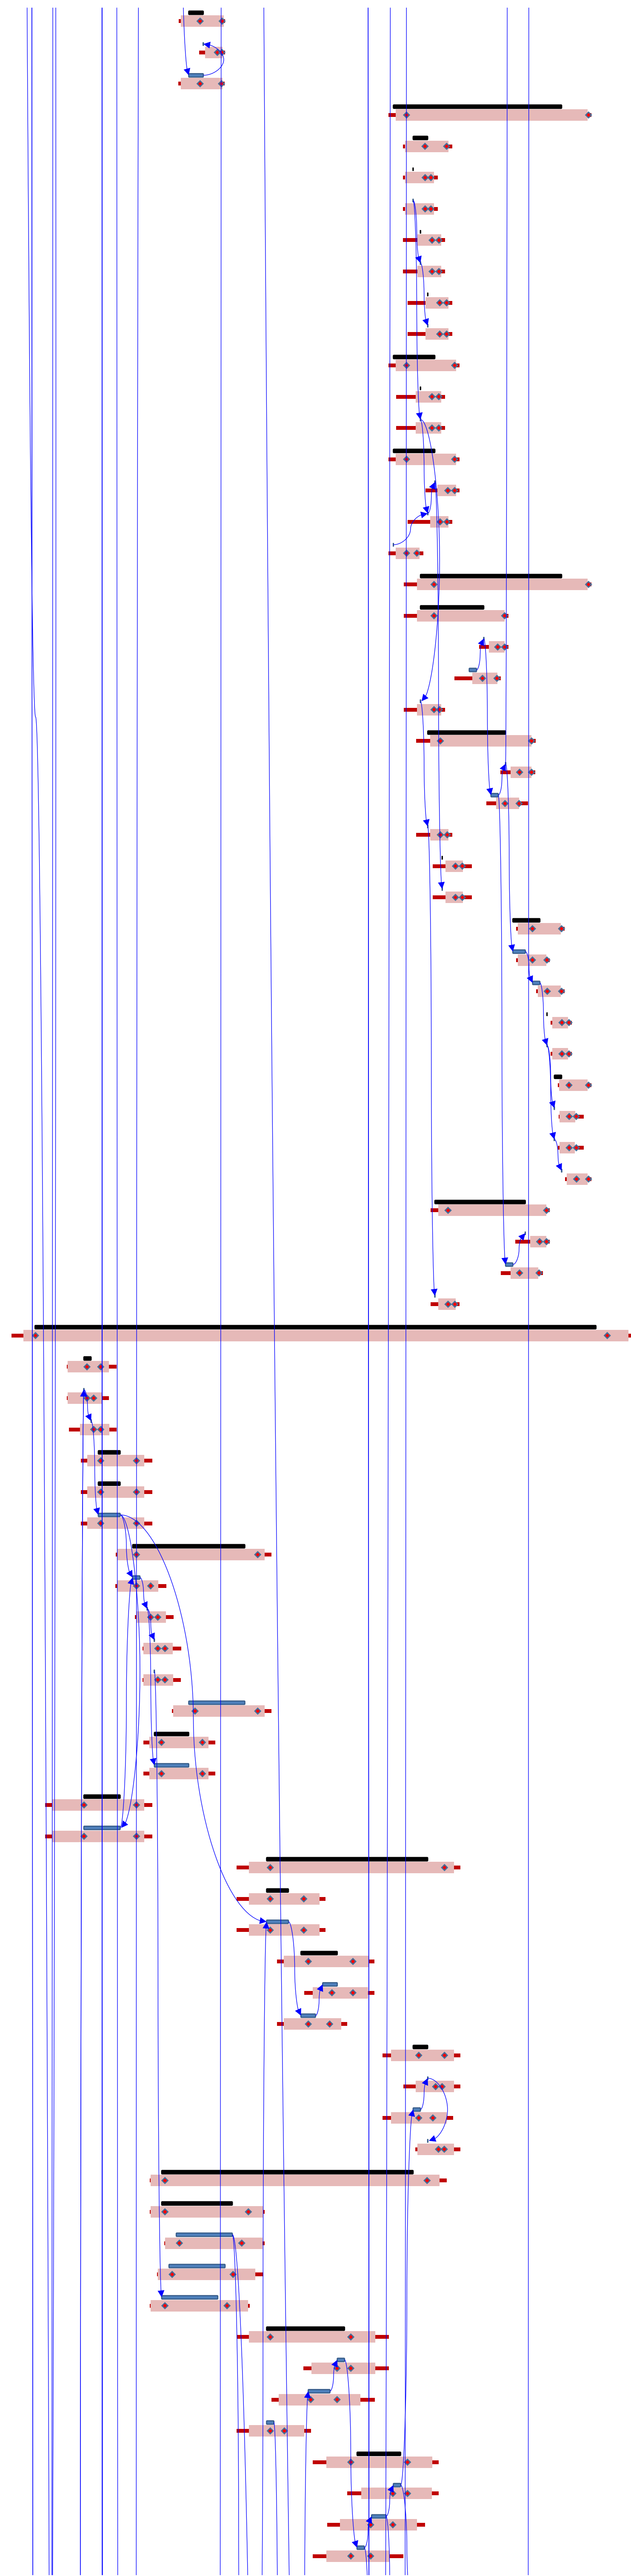




##	<b>LOSAS MACISAS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>do 10/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2-P/LOSA MACIZA	do 10/4/16	do 10/4/16	13%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	vi 8/4/16	do 10/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	ma 5/4/16	ju 7/4/16	0%
##	<b>TAPAS DE CONCRETO DE POZO</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2-P/TAPAS	ma 22/3/16	ma 22/3/16	13%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TAPAS	lu 21/3/16	lu 21/3/16	13%
##	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	do 20/3/16	do 20/3/16	13%
##	<b>ALBAÑILERIA</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	MURO LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM	vi 25/3/16	do 27/3/16	13%
##	<b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	n/a
##	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	ma 12/4/16	vi 15/4/16	13%
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	lu 18/4/16	ju 21/4/16	13%
##	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 16/4/16	do 17/4/16	13%
##	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	ma 12/4/16	vi 15/4/16	0%
##	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	mi 20/4/16	ju 21/4/16	13%
##	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5 E=1.0 CM	vi 22/4/16	vi 22/4/16	13%
##	<b>CIELORRASOS</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	n/a
##	<b>CIELORRASO CON MEZCLA</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	n/a
##	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4, E=1.5 CM	lu 11/4/16	lu 11/4/16	13%
##	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	<b>PISOS DE CONCRETO</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN CUADRADOS S=1%	sá 23/4/16	sá 23/4/16	13%
##	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>	<b>do 24/4/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	n/a
##	<b>ZOCALOS</b>	<b>ma 26/4/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	n/a
##	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.60M.	ma 26/4/16	mi 27/4/16	13%
##	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>do 24/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	n/a
##	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10 m	do 24/4/16	lu 25/4/16	13%
##	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>ju 28/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	n/a
##	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	ju 28/4/16	ju 28/4/16	13%
##	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO	vi 29/4/16	vi 29/4/16	13%
##	<b>CERRAJERIA</b>	<b>ju 28/4/16</b>	<b>ju 28/4/16</b>	n/a
##	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2 "	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>sá 30/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	sá 30/4/16	do 1/5/16	13%
##	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	lu 2/5/16	ma 3/5/16	13%
##	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	ma 3/5/16	ma 3/5/16	13%
##	<b>OTROS</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>vi 15/4/16</b>	n/a
##	<b>ACCESORIOS PARA POZO</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	GEOTEXTIL PARA PROTECCION CONTRA SEDIMENTOS	sá 12/3/16	sá 19/3/16	0%
##	ACCESORIOS DE VENTILACION,RED DE SUCCION Y RED DE CONDUCCION	do 20/3/16	do 27/3/16	0%
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC-P Ø 2 "	lu 21/3/16	ma 22/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a
##	CODO PVC SAP 90° x Ø2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	TEE PVC SAP 90° x Ø1.1/2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	TAPON PVC SAP DE CEBADO Ø1.1/2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	UNION UNIVERSAL PVC SAP 2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1.1/2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° DE 2 "	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	SOPORTE DE TUBERIA DE IMPULSION	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	<b>VALVULAS</b>	<b>vi 15/4/16</b>	<b>vi 15/4/16</b>	n/a
##	VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE BRONCE DE 2 "	vi 15/4/16	vi 15/4/16	0%
##	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2 "	vi 15/4/16	vi 15/4/16	0%
##	VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2 "	vi 15/4/16	vi 15/4/16	0%
##	<b>ESTUDIOS PREVIOS A LA EJECUCION</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>do 28/2/16</b>	n/a
##	ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGIVO DEL AGUA	ma 23/2/16	do 28/2/16	7%
##	ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOFISICA:SONDEOS ELECTRICO VERTICALES	ma 23/2/16	do 28/2/16	6%
##	<b>ARQUITECTURA</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	<b>EDIFICACION</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>sá 27/2/16</b>	n/a
##	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	ma 23/2/16	sá 27/2/16	4%
##	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA C:A 1:5	ma 23/2/16	ju 25/2/16	4%
##	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	vi 26/2/16	sá 5/3/16	4%
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	do 6/3/16	lu 14/3/16	4%
##	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	ma 15/3/16	ju 17/3/16	4%
##	ENCHAPES CON PORCELANATO 0.60X0.60M EN OVALIN	sá 5/3/16	sá 5/3/16	0%
##	ENCHAPES CON PORCELANATO 0.60X0.60M EN COCINA	do 6/3/16	do 6/3/16	0%
##	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	sá 27/2/16	sá 5/3/16	0%
##	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	ma 8/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>CIELORRASOS</b>	<b>vi 15/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	CIELORRASO DE PLANCHA SUPERBOARD INTERIOR Y EXTERIOR (INC. INSTALACION)	vi 15/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	n/a
##	<b>CONTRAPISOS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>ma 5/4/16</b>	n/a
##	CONTRAPISO E=4 CM BASE 3 CM. MEZC. C:H 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA C:A 1:2 (ACABADO SEMIPULIDO)	ma 5/4/16	ma 5/4/16	0%
##	<b>PISOS</b>	<b>ma 5/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	n/a
##	PISO CERAMICO 30x30cm ANTIDSLIZANTE DE ALTO TRANSITO E=7.2mm	mi 6/4/16	vi 8/4/16	0%

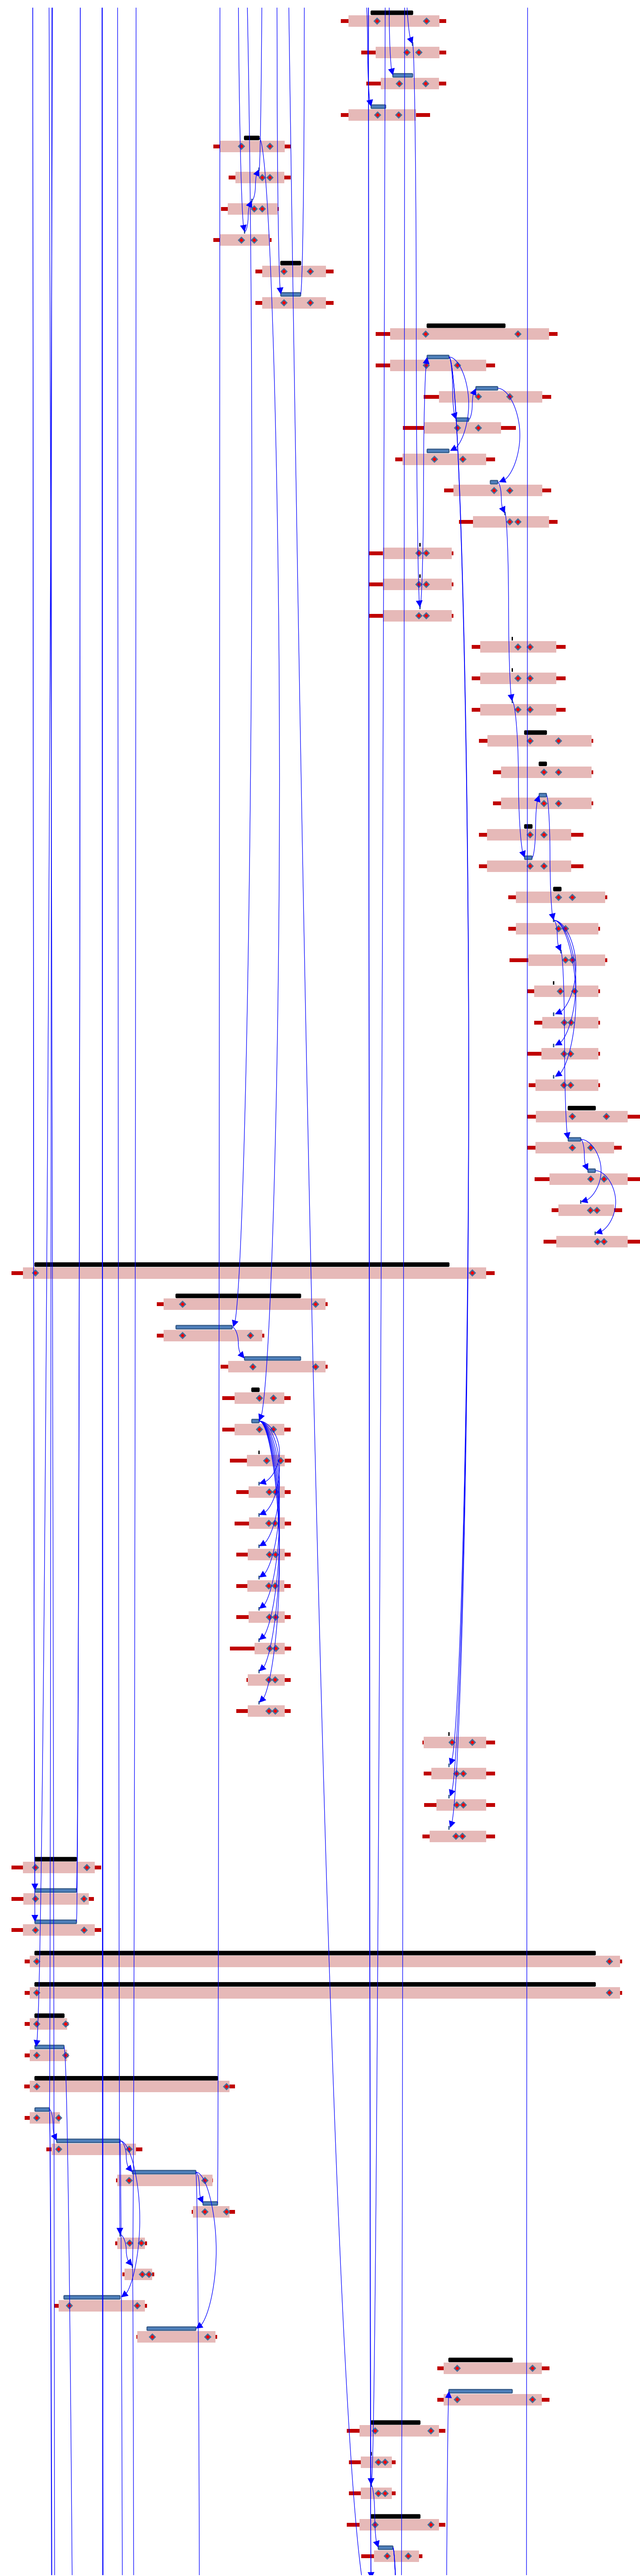


##	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR ROJO INDIO	ma 5/4/16	ma 5/4/16	0%
##	PISO DE MADERA MACHIHEMBREADA DE 3/4", INC DURMIENTES	ma 5/4/16	lu 11/4/16	4%
##	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>	<b>mi 6/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	<b>ZOCALOS</b>	<b>sá 9/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 cm	sá 9/4/16	do 17/4/16	0%
##	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>mi 6/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	mi 6/4/16	mi 6/4/16	0%
##	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO EN EXTERIORES H=0.60m y H=0.75m	ju 7/4/16	sá 9/4/16	0%
##	CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10M	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	CONTRAZOCALO LISTON DE MADERA H=0.10m	ma 12/4/16	ma 12/4/16	4%
##	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	n/a
##	<b>PUERTAS</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>sá 30/4/16</b>	n/a
##	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACIZA C/MARCO DE MADERA 2"x6" C/TOPE DE ACERO DE MEDIA LUNA	lu 25/4/16	ju 28/4/16	4%
##	PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 mm TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, CON MARCO DE MADERA TORNILLO 2" vi	29/4/16	sá 30/4/16	0%
##	<b>VENTANAS</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	n/a
##	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LI	vi 29/4/16	do 1/5/16	4%
##	<b>MUEBLES DE COCINA Y SIMILARES</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	n/a
##	MUEBLE BAJO DE MADERA P/COCINA H=0.65m	lu 18/4/16	ju 21/4/16	0%
##	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>vi 18/3/16</b>	n/a
##	<b>PUERTAS DE FIERRO</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>vi 18/3/16</b>	n/a
##	PUERTA METALICA PR-01 (2.80x2.55m) INCL. INSTALACION	ma 15/3/16	ma 15/3/16	0%
##	PUERTA METALICA PR-02 (2.00x2.55m) INCL. INSTALACION	mi 16/3/16	mi 16/3/16	0%
##	PUERTA METALICA P10 (0.80x2.55m) INCL. INSTALACION	ju 17/3/16	ju 17/3/16	0%
##	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO M3 (1.25 x 2.55m) INCL. INSTALACION	vi 18/3/16	vi 18/3/16	0%
##	<b>CERRAJERIA</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	<b>BISAGRAS</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	n/a
##	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 4" PARA PUERTAS DE MADERA	lu 25/4/16	ma 26/4/16	0%
##	BISAGRAS METALICAS DE 3 1/2" x 3 1/2"	ju 17/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>CERRADURAS</b>	<b>mi 27/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	mi 27/4/16	ju 28/4/16	0%
##	CERRADURA DE POMO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA INTERIOR	vi 29/4/16	sá 30/4/16	0%
##	CERROJO TIPO SAPITO DE ACERO INOXIDABLE C/CADENA L=1.20m. (VENTANAS)	vi 29/4/16	do 1/5/16	0%
##	PICAPORTE ALUMINIZADA DE 1"x3"	lu 2/5/16	ma 3/5/16	1%
##	<b>ACCESORIOS DE CIERRE</b>	<b>lu 2/5/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	lu 2/5/16	ma 3/5/16	1%
##	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	ESPEJO BISELADO 1.15x0.75M	lu 18/4/16	lu 18/4/16	0%
##	ESPEJO BISELADO 0.60x0.75M	lu 18/4/16	lu 18/4/16	0%
##	VIDRIO CRUDO DE 8mm. INC. LAMINA DE SEGURIDAD P/VENTANA	lu 2/5/16	ma 3/5/16	1%
##	<b>PINTURA</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>sá 30/4/16</b>	n/a
##	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	mi 13/4/16	lu 18/4/16	4%
##	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	vi 15/4/16	mi 20/4/16	4%
##	PINTURA AL LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AMARILLO MARACUYÁ	mi 13/4/16	ju 14/4/16	4%
##	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	vi 15/4/16	lu 18/4/16	4%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN EXTERIORES	ma 19/4/16	vi 22/4/16	4%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO INDIO - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN INTERIORES	sá 23/4/16	do 24/4/16	4%
##	PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA	vi 29/4/16	sá 30/4/16	0%
##	PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS	ju 17/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>OTROS</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	n/a
##	<b>PLACA DE OBRA</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	n/a
##	PLACA DE OBRA	lu 25/4/16	lu 25/4/16	0%
##	<b>SEÑALIZACION</b>	<b>ma 26/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	n/a
##	SEÑALETICA DE NOMBRES DE AMBIENTES 0.10Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	ma 26/4/16	ma 26/4/16	0%
##	SEÑALETICA DE SEGURIDAD 0.20Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	ma 26/4/16	ma 26/4/16	0%
##	SEÑALETICA DE AVISOS (ADHESIVOS+DOBLE ACRILICO 3MM)	mi 27/4/16	mi 27/4/16	0%
##	PANEL DE SECTORES 0.90X1.10M. EN MADERA TIPO MDF 18MM (CON ETIQUETAS TIPO GALLETAS 0.10x0.10)	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0%
##	LETRERO DE TAMBOS 1.30X0.70M EN TRIPLAY 19MM (CON LETRAS EN ACRILICO 5MM SEGUN MODELO)	vi 29/4/16	vi 29/4/16	0%
##	<b>MURAL</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	MURAL CON PINTURA LATEX SATINADO 2.85X8.35M (SEGUN MODELO)	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	n/a
##	<b>EDIFICACION</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	n/a
##	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>	<b>do 17/4/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	n/a
##	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>do 17/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	INODORO ONE PICE LIBERTY	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA CON ESCURRIDERA	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	URINARIO TIPO ACADEMY BLANCO	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</b>	<b>do 17/4/16</b>	<b>do 17/4/16</b>	n/a
##	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA TIPO TELEFONO, INCL. ACCESORIOS	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA CROMADA MONOMANDO P/LAVATORIO	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	GRIFERIA SIMPLE P/URINARIO	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	AGARRADERA DE TUBO DE FIERRO D=2" CROMADO	do 17/4/16	do 17/4/16	0%
##	<b>INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>sá 23/4/16</b>	n/a
##	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	ju 21/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>INSTALACION DE ACCESORIOS</b>	<b>do 24/4/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	n/a

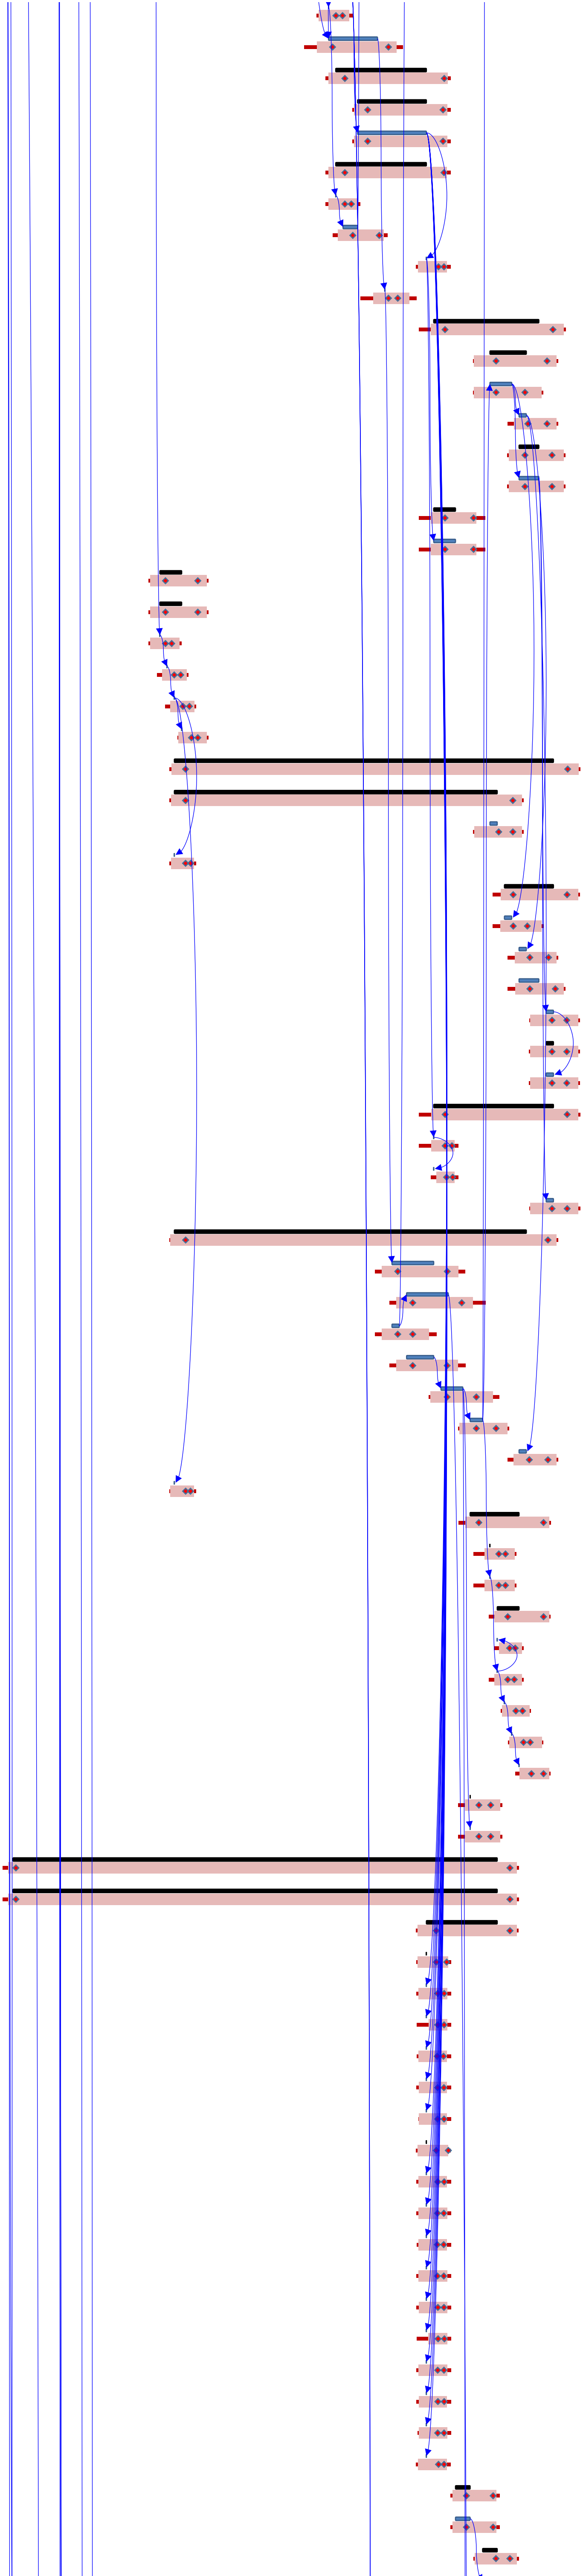




##	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	do 24/4/16	ma 26/4/16	0%
##	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>mi 9/3/16</b>	n/a
##	<b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>mi 2/3/16</b>	n/a
##	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	vi 26/2/16	mi 2/3/16	0%
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1.1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%
##	<b>REDES DE ALIMENTACION</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>do 6/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1" DE CAJA DE REGISTRO AL TAMBO	sá 5/3/16	do 6/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø3/4	mi 2/3/16	ju 3/3/16	0%
##	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	mi 2/3/16	sá 5/3/16	0%
##	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TEE PVC SAP Ø1"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TEE PVC SAP xØ3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TEE PVC SAP x Ø1/2	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES 1"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES 3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%
##	<b>VALVULAS</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a
##	VALVULA DE PASO 1.1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	VALVULA DE PASO 1"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	VALVULA DE PASO 3/4	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	VALVULA DE PASO 1/2"	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%
##	GRIFO DE RIEGO 1/2"	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%
##	<b>TRABAJOS PARA REDES DE AGUA FRIA</b>	<b>vi 4/3/16</b>	<b>mi 9/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	sá 5/3/16	mi 9/3/16	0%
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	ma 8/3/16	mi 9/3/16	0%
##	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	lu 7/3/16	mi 9/3/16	0%
##	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	vi 4/3/16	mi 9/3/16	0%
##	<b>CAJAS DE REGISTRO-CUERPO</b>	<b>lu 29/2/16</b>	<b>lu 29/2/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CAJAS DE REGISTRO	lu 29/2/16	lu 29/2/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	lu 29/2/16	lu 29/2/16	0%
##	<b>VEREDAS EN CONTORNO DE CAJA DE REGISTRO</b>	<b>ma 1/3/16</b>	<b>ma 1/3/16</b>	n/a
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	ma 1/3/16	ma 1/3/16	0%
##	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	ma 1/3/16	ma 1/3/16	0%
##	TAPA DE REGISTRO GALVANIZADO	ma 1/3/16	ma 1/3/16	0%
##	<b>SISTEMA DE AGUA CALIENTE</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	n/a
##	<b>SALIDAS DE AGUA CALIENTE</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 26/2/16</b>	n/a
##	SALIDAS DE AGUA CALIENTE PARA TUBERIA C-PVC C-10 1/2"	vi 26/2/16	vi 26/2/16	0%
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA CPVC C-10 Ø3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TUBERIA CPVC C-10 Ø1/2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	n/a
##	CODO CPVC SAP 90° x Ø3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	CODO CPVC SAP 90° x Ø1/2"	mi 2/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TEE CPVC SAP 90° x Ø3/4	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TEE CPVC SAP 90° x Ø1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	REDUCCION CPVC SAP 3/4" A 1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	REDUCCION CPVC SAP 4" A 2"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	TRAMPA P PVC SAP Ø2	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES CPVC 3/4	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	UNIONES UNIVERSALES CPVC 1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	<b>VALVULAS</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	n/a
##	VALVULA DE PASO Ø 3/4"	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	VALVULA DE PASO Ø 1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	mi 2/3/16	mi 2/3/16	0%
##	<b>TRABAJOS PARA REDES DE AGUA CALIENTE</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	ju 3/3/16	ju 3/3/16	0%
##	<b>DESAGUE Y VENTILACION</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	n/a
##	<b>SALIDAS DE DESAGUE</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL 2"	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>REDES DE DERIVACION</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC UF 110MM S-20	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	<b>REDES COLECTORAS INTERIORES</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a

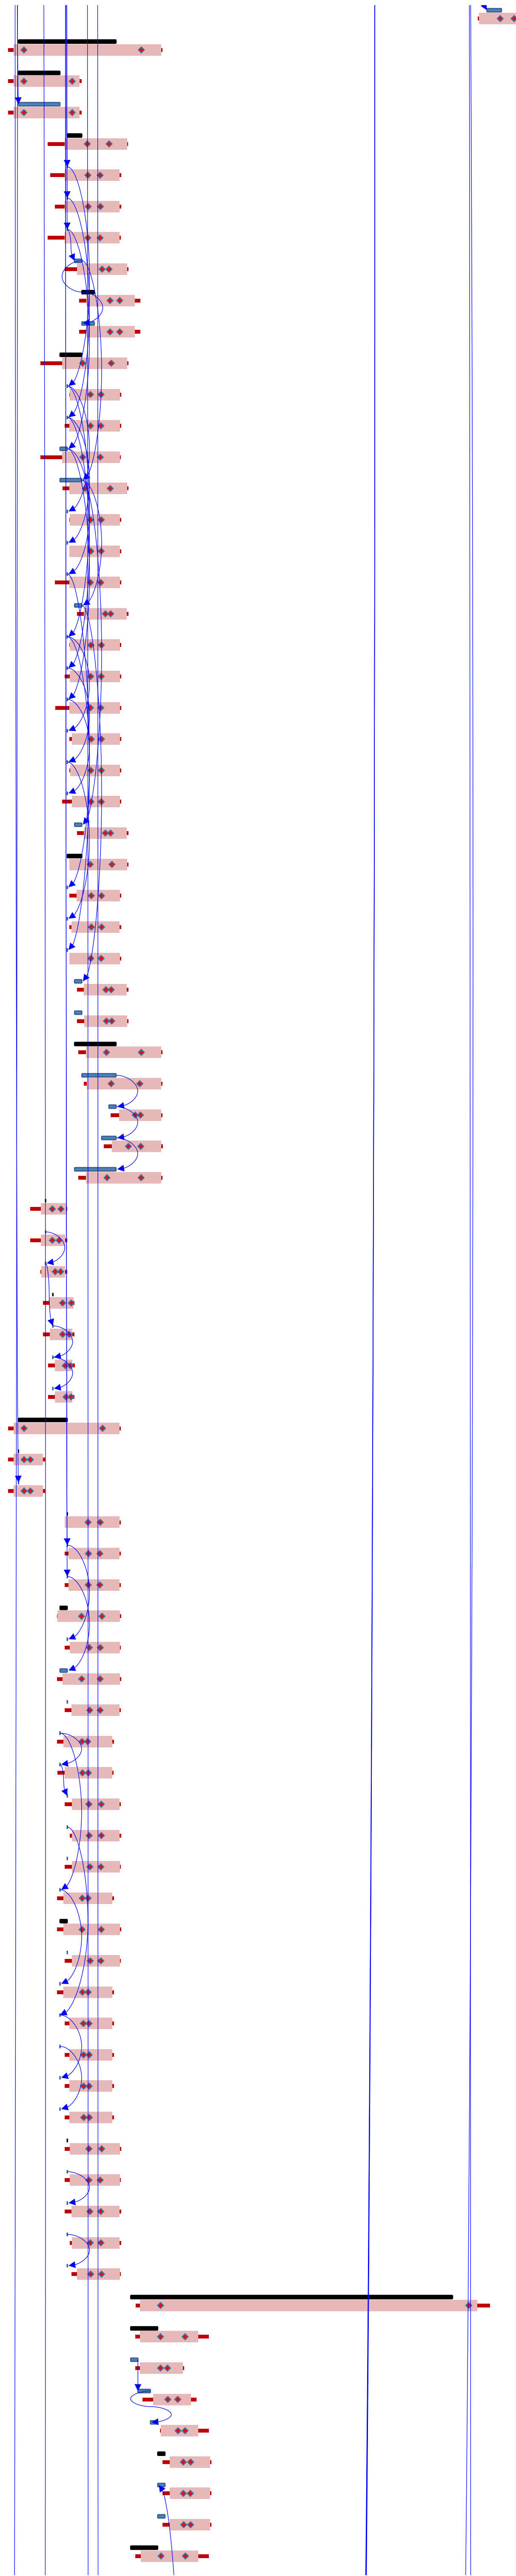


##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>ACCESORIOS DE REDES DESAGUE</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	YEE PVC SAL Ø4"x2"	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	YEE PVC SAL Ø2"	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	DOBLE YEE PVC SAL Ø2"	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	vi 11/3/16	do 13/3/16	0%
##	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø2"	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	TEE SANITARIA PVC SAL Ø4	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%
##	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	sá 12/3/16	do 13/3/16	0%
##	TRAMPA P PVC SAL Ø2	lu 14/3/16	ma 15/3/16	0%
##	<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>	<b>vi 8/4/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	n/a
##	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	vi 8/4/16	vi 8/4/16	0%
##	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	vi 8/4/16	vi 8/4/16	0%
##	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	vi 8/4/16	vi 8/4/16	0%
##	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	vi 8/4/16	vi 8/4/16	0%
##	REJILLA DE BRONCE PARA VENTILACION DE 2"	mi 20/4/16	mi 20/4/16	0%
##	<b>TRABAJOS PARA REDES DE DESAGUE</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	vi 11/3/16	lu 14/3/16	0%
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	sá 12/3/16	lu 14/3/16	0%
##	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	vi 11/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	<b>CAJAS DE INSPECCION DE DESAGUE-CUERPO</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJAS DE REGISTRO	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	lu 14/3/16	mi 16/3/16	0%
##	<b>CAJAS DE INSPECCION-TAPAS</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJAS DE REGISTRO	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE MEDIANTE BIODIGESTOR</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ju 24/3/16	ma 29/3/16	0%
##	<b>RELLENOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	ju 24/3/16	vi 25/3/16	0%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	sá 26/3/16	mi 30/3/16	0%
##	RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2" A 5"	lu 28/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	<b>SOLADOS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	SOLADO C/MEZCLA 1:10 C:H E=2"	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	<b>LOSA DE CONCRETO EN BASE Y TAPA DE BIODIGESTOR</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/LOSAS	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	<b>POZO DE LODOS C/TAPA CONCRETO</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/POZO	lu 28/3/16	ma 29/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	do 27/3/16	ma 29/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	lu 28/3/16	ma 29/3/16	0%
##	<b>CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/POZO	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>CAJA DE VALVULAS C/TAPA DE CONCRETO</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJA	mi 30/3/16	ju 31/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	mi 30/3/16	ju 31/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	mi 30/3/16	ju 31/3/16	0%
##	<b>BIOFILTRO</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/BIOFILTRO	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	ju 31/3/16	sá 2/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	<b>TAPA DE BIODIGESTOR</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/TAPAS	do 3/4/16	lu 4/4/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	do 3/4/16	lu 4/4/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	do 3/4/16	lu 4/4/16	0%
##	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	<b>POZO DE LODOS C/TAPAS DE CONCRETO</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>sá 2/4/16</b>	n/a
##	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0%
##	<b>CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO</b>	<b>sá 2/4/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	n/a
##	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	sá 2/4/16	do 3/4/16	0%
##	<b>BIOFILTRO</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	n/a
##	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	do 3/4/16	lu 4/4/16	0%
##	<b>BIODIGESTOR</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	n/a
##	BIODIGESTOR DE 3000L INC. ACCESORIOS E INSTALACION	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	<b>BIOFILTRO</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	BIOFILTRO INC. ACCESORIOS E INSTALACION	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	<b>TUBERIAS Y ACCESORIOS</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA DE PVC SAL 4"	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%

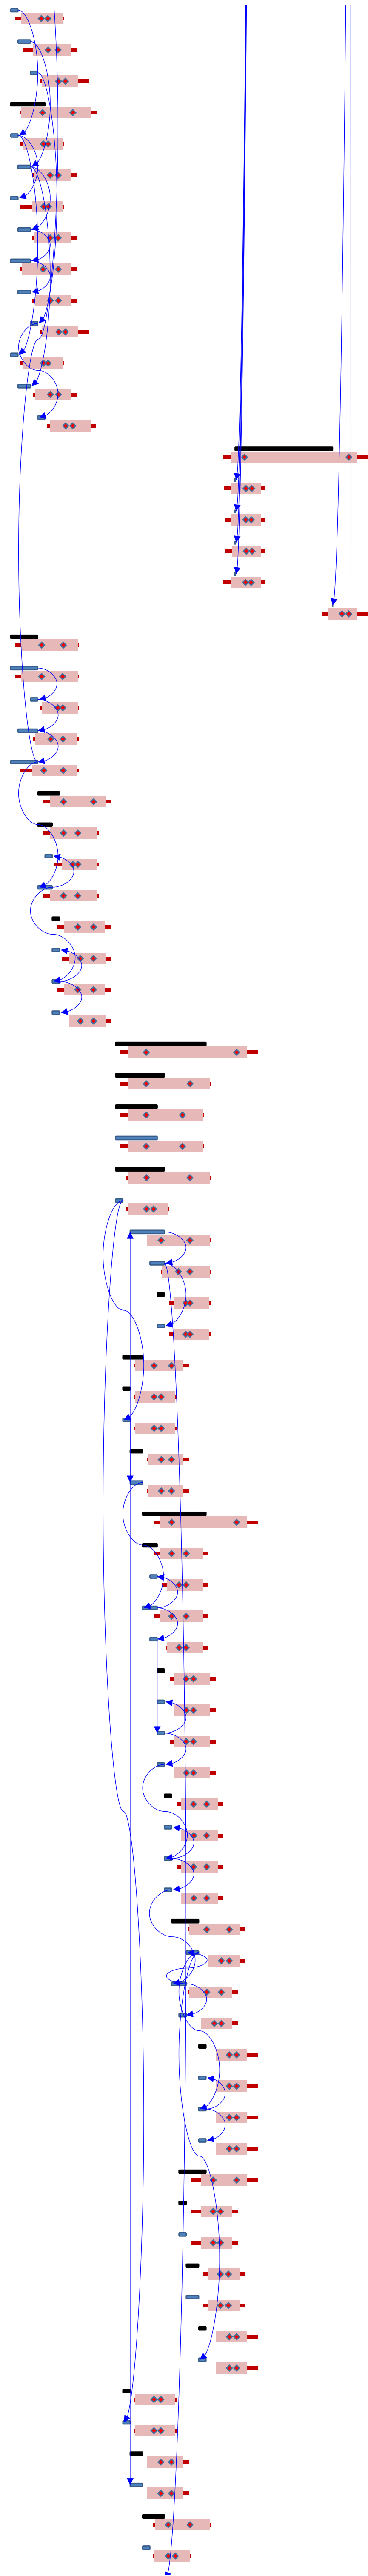



##	TUBERIA DE PVC SAL 4" PERFORADA	ma 29/3/16	mi 30/3/16	0%	
##	TUBERIA DE PVC SAL 2"	do 27/3/16	lu 28/3/16	0%	
##	ACCESORIOS DE INSTALACION DE TUBERIAS	lu 28/3/16	ma 29/3/16	0%	
##	<b>CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DESDE EXTERIOR</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a	
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a	
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>lu 29/2/16</b>	n/a	
##	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50M X H=1.00M (RED DE AGUA)	vi 26/2/16	lu 29/2/16	0%	
##	<b>RELLENOS</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 4/3/16</b>	n/a	
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	vi 26/2/16	vi 26/2/16	0%	
##	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	sá 27/2/16	sá 27/2/16	0%	
##	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.40M	do 28/2/16	lu 29/2/16	0%	
##	SEGUNDO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR E=0.50M	ma 1/3/16	vi 4/3/16	0%	
##	<b>SISTEMA DE REDES AGUA FRIA</b>	<b>do 28/2/16</b>	<b>do 28/2/16</b>	n/a	
##	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>	<b>do 28/2/16</b>	<b>do 28/2/16</b>	n/a	
##	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	do 28/2/16	do 28/2/16	0%	
##	<b>PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>vi 1/4/16</b>	n/a	
##	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	mi 30/3/16	vi 1/4/16	0%	
##	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	ju 31/3/16	vi 1/4/16	0%	
##	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS</b>	<b>lu 22/2/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	n/a	
##	<b>CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDOR (A FUTURO)</b>	<b>lu 22/2/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a	
##	<b>TRABAJOS PARA REDES E INSTALACIONES EXTERIORES</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>vi 26/2/16</b>	n/a	
##	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE REDES	ma 23/2/16	mi 24/2/16	0%	
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	mi 24/2/16	ju 25/2/16	0%	
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	ju 25/2/16	vi 26/2/16	0%	
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (PORTAMEDIDOR-TABLERO GENERAL)	ju 25/2/16	vi 26/2/16	0%	
##	<b>MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a	
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	vi 26/2/16	sá 27/2/16	0%	
##	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	sá 27/2/16	do 28/2/16	0%	
##	MURO DE LADRILLO CABEZA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM	do 28/2/16	lu 29/2/16	0%	
##	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	lu 29/2/16	ma 1/3/16	0%	
##	CAJA METALICA DE MEDIDOR	lu 29/2/16	ma 1/3/16	0%	
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO	vi 4/3/16	sá 5/3/16	0%	
##	<b>ACOMETIDA ELECTRICA</b>	<b>lu 22/2/16</b>	<b>ma 23/2/16</b>	n/a	
##	ACOMETIDA DOMICILIARIA ELECTRICA	lu 22/2/16	ma 23/2/16	0%	
##	<b>SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	n/a	
##	<b>SALIDA</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	n/a	
##	SALIDAS PARA CENTRO DE LUZ	sá 16/4/16	vi 22/4/16	0%	
##	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA	lu 7/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	vi 11/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	sá 12/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION.	sá 12/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	SALIDA PARA SENSORES DE APERTURA DE PUERTAS (OFICINAS)	do 13/3/16	do 13/3/16	0%	
##	SALIDAS PARA PANEL DE INTRUSION	lu 14/3/16	lu 14/3/16	0%	
##	SALIDA PARA SENSOR DE INTRUSION	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%	
##	SALIDAS PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	ju 17/3/16	sá 19/3/16	0%	
##	SALIDAS PARA ALTO PARLANTE	do 20/3/16	do 20/3/16	0%	
##	SALIDAS PARA TERMA ELECTRICA	lu 21/3/16	lu 21/3/16	0%	
##	<b>CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	n/a	
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (TABLERO GENERAL-T. DISTRIBUCION)	vi 26/2/16	sá 27/2/16	0%	
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm (TECHO-MALLA A TIERRA)	vi 26/2/16	vi 26/2/16	0%	
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm (ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE)	vi 26/2/16	sá 5/3/16	0%	
##	<b>CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>sá 12/3/16</b>	n/a	
##	CABLE ELECTRICO 2-1x2.5mm2 NH + 1x2.5mm2 LSOH(T) - ALUMBRADO	lu 7/3/16	ma 8/3/16	0%	
##	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	mi 9/3/16	ju 10/3/16	0%	
##	CABLE ELECTRICO 2-1x6mm2 NH +1x4mm2 (T) LSOH (T.G-TD)	vi 11/3/16	vi 11/3/16	0%	
##	CABLE ELECTRICO 2-1x10mm2 NH + 1X6mm2 (T) LSOH (GRUPO G. -TABLERO GENERAL)	sá 12/3/16	sá 12/3/16	0%	
##	<b>TABLEROS DE DISTRIBUCION</b>	<b>do 6/3/16</b>	<b>do 6/3/16</b>	n/a	
##	TABLERO GENERAL TGD	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-1	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-2	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-3	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLEROS ESTABILIZADO TD-E	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLERO DE TRANSFERENCIA (CON LLAVE DE CONMUTACION)	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE ELECTROBOMBA (0.6HP)	do 6/3/16	do 6/3/16	0%	
##	<b>INSTALACION DE PARARRAYOS</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a	
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a	
##	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	n/a	
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%	
##	<b>RELLENOS</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a	
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	mi 23/3/16	mi 23/3/16	0%	
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	mi 23/3/16	mi 23/3/16	0%	
##	<b>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	n/a	
##	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	mi 23/3/16	mi 23/3/16	0%	
##	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a	
##	<b>SOLADOS</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a	
##	SOLADO C/MEZCLA 1:10 C:H E=2"	ju 24/3/16	ju 24/3/16	0%	
##	<b>DADO DE CONCRETO 0.50X0.50X1.00M P/ ANCLAJE DE TEMPLADORES</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a	
##	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	ma 29/3/16	ma 29/3/16	0%	
##	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a	
##	<b>ZAPATAS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a	
##	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS	vi 25/3/16	vi 25/3/16	0%	

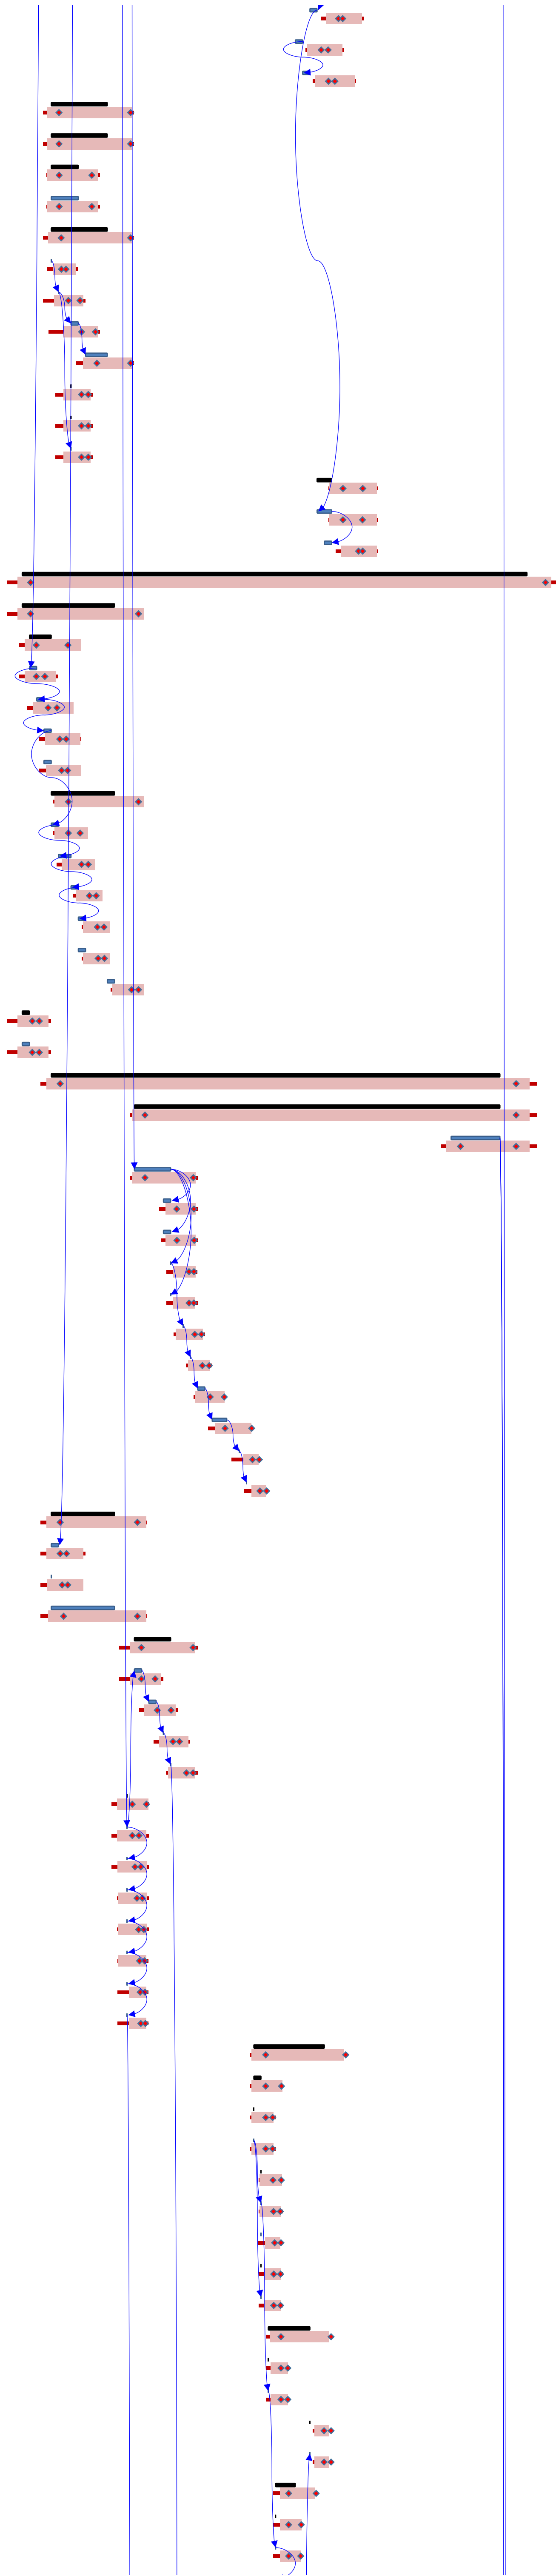

##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	vi 25/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>COLUMNAS</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS	do 27/3/16	do 27/3/16	0%
##	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	sá 26/3/16	sá 26/3/16	0%
##	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>lu 28/3/16</b>	n/a
##	TORRE VENTADA DE ESTRUCTURA METALICA H=9M. INC. TEMPLADORES DE CABLE DE RETENIDA 1/4" ASTM	lu 28/3/16	lu 28/3/16	0%
##	<b>PINTURA</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	n/a
##	PINTURA ANTICORROSIVA EN TORRE VENTADA	mi 30/3/16	mi 30/3/16	0%
##	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO-BLANCO PARA CARPINTERIA METALICA EN TORRE VENTADA	ju 31/3/16	ju 31/3/16	0%
##	<b>PARARRAYOS</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	n/a
##	PARARRAYOS PDC, INCLUYE PEDESTAL	ma 29/3/16	ma 29/3/16	0%
##	<b>INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	ma 22/3/16	sá 26/3/16	0%
##	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	vi 25/3/16	sá 26/3/16	0%
##	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	ju 24/3/16	sá 26/3/16	0%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	ju 24/3/16	do 27/3/16	0%
##	POZO DE TIERRA	lu 21/3/16	do 27/3/16	0%
##	CABLE 1X70mm2 COBRE DESNUDO	vi 25/3/16	do 27/3/16	0%
##	BENOTINA Y SAL	sá 19/3/16	do 27/3/16	0%
##	ACCESORIOS DE TERMOFUSION	sá 26/3/16	do 27/3/16	0%
##	<b>ARTEFACTOS</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	n/a
##	<b>LAMPARAS</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>do 24/4/16</b>	n/a
##	LAMPARA LED DOWN LIGTH 20W	sá 23/4/16	do 24/4/16	0%
##	LAMPARA LED DOWN LIGTH 28W	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0%
##	PANEL 120x30CM LED LIGHT 36W	sá 23/4/16	do 24/4/16	0%
##	LUZ DE EMERGENCIA	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0%
##	<b>REFLECTORES</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	n/a
##	REFLECTOR LED FLOOD LIGTH 50W-EXTERIORES	lu 25/4/16	lu 25/4/16	0%
##	<b>EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	<b>BOMBAS PARA AGUA</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	<b>SALIDA</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	n/a
##	SALIDAS DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA	do 13/3/16	do 13/3/16	0%
##	<b>CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	do 13/3/16	do 13/3/16	0%
##	<b>CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	n/a
##	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	lu 14/3/16	lu 14/3/16	0%
##	<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	ma 15/3/16	ma 15/3/16	0%
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	ma 15/3/16	mi 16/3/16	0%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	ju 17/3/16	do 20/3/16	0%
##	<b>SISTEMAS ELECTROMECANICOS</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	n/a
##	OBRAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (3 CAMARAS FIJAS Y 1 DOMO PTZ180/360)	do 20/3/16	do 20/3/16	0%
##	OBRAS PARA SISTEMA DE SEGURIDAD - ALARMA CONTRA ROBO	do 20/3/16	do 20/3/16	0%
##	OBRAS PARA SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO	do 20/3/16	do 20/3/16	0%
##	OBRAS PARA ALTOPARLANTES	do 20/3/16	do 20/3/16	0%
##	<b>TUBERIAS</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	vi 18/3/16	do 20/3/16	0%
##	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO)	vi 18/3/16	do 20/3/16	0%
##	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M (ALARMA CONTRA INCENDIO)	vi 18/3/16	do 20/3/16	0%
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (SISTEMA DE ALTO PARLANTE)	sá 19/3/16	do 20/3/16	0%
##	<b>SALIDAS</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	n/a
##	SALIDAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	lu 21/3/16	lu 21/3/16	0%
##	<b>CABLEADO DE DATA</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	n/a
##	CABLE UTP CAT 6 (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0%
##	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO)	mi 23/3/16	mi 23/3/16	0%
##	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA CONTRA INCENDIO)	ju 24/3/16	ju 24/3/16	0%
##	<b>POSTES DE SOPORTE DE CAMARAS DE VIGILANCIA</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	n/a
##	POSTES DE SOPORTE DE CAMARA DE VIGILANCIA Ø1.1/2" H=1.50M	vi 25/3/16	vi 25/3/16	0%
##	<b>VARIOS</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	<b>PRUEBAS ELECTRICAS</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	n/a
##	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DE POZO A TIERRA	mi 30/3/16	mi 30/3/16	0%
##	<b>INSTALACIONES DE COMUNICACIONES</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICACION</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	n/a
##	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	do 13/3/16	do 13/3/16	0%
##	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	do 13/3/16	lu 14/3/16	0%
##	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	mi 16/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>CABLEADO Y ACCESORIOS</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	n/a
##	CABLE UTP CAT 6 (CABLEADO ESTRUCTURADO)	ma 15/3/16	ju 17/3/16	0%
##	ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO INC. INSTALACION	ju 17/3/16	ju 17/3/16	0%
##	INSTALACION PARA UPS'S INC. CABLE, TABLERO, INTERRUPTORES Y SUPRESORES TRANSITORIOS	ju 17/3/16	ju 17/3/16	0%
##	<b>CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	n/a
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50mm	sá 12/3/16	sá 12/3/16	0%
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm	do 13/3/16	do 13/3/16	0%
##	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	sá 12/3/16	ma 15/3/16	0%
##	<b>SALIDAS DE COMUNICACIONES</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>mi 9/3/16</b>	n/a
##	SALIDA PARA DATA / WIFI	lu 7/3/16	lu 7/3/16	0%
##	SALIDA PARA DATA/ TELEFONO IP	lu 7/3/16	mi 9/3/16	0%





##	PATCH PANEL	ju 10/3/16	ju 10/3/16	n/a	
##	INSTALACION DE PATCH PANEL	ju 10/3/16	ju 10/3/16	0%	
##	RACK DE COMUNICACIONES	ju 10/3/16	ju 10/3/16	n/a	
##	INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES	ju 10/3/16	ju 10/3/16	0%	
##	EQUIPAMIENTO	vi 29/4/16	ma 3/5/16	n/a	
##	MOBILIARIO BASICO	do 1/5/16	lu 2/5/16	n/a	
##	MESA DE REUNIONES: MUEBLE 1.20X1.20M, MADERA QUINILLA	do 1/5/16	do 1/5/16	2%	
##	CAMA 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CAMAROTES 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES : 1.50 X .75 CORRIZAS TELESCOPICA (INC. CERRADURA)	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%	
##	ESTANTES PARA DOCUMENTOS: DE 0.80x2.40m MADERA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	MESA RECTANGULAR DE MADERA TORNILLO: 1.50 X 0.90M	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 2.70 X 2.55 X 0.65	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%	
##	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 1.05 X 2.55 X 0.65	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%	
##	SILLA COMEDOR (SIN BRAZOS MADERA)	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%	
##	SILLAS DE OFICINA: ESTRUCTURA DE PVC	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	SILLAS PLÁSTICAS APILABLE SIN CODERAS PVC	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	VELADOR DE MADERA TORNILLO: 0.48 X 0.48M	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	ESTANTE METALICO INDUSTRIAL CON 5 DIVISIONES L=5.15M, A=1.00M, H=2.40M.	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	EQUIPAMIENTO BASICO	vi 29/4/16	ma 3/5/16	n/a	
##	OFICINAS	do 1/5/16	do 1/5/16	n/a	
##	CAMARA WEB 5MPX 1080P HD, CAP. VIDEO 720P, ZOOM DIGITAL 3X, MICROFONO INCORP.	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CÁMARA DE FOTOS SEMI PROFESIONAL 12.1 MPX CMOS 1/1.7" SX(28mm-140mm) 4.0X + FILMADORA PANT	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	ALTOPARLANTE -BOCINA DE PERIFONEO 20" POT. 200W RMS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	MEZCLADORA /AMPLIFICADOR DE PODER 3 ENTRADAS DE MIC. DOS ENTRADAS DE LINEA. 240W EN SALIDA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	MICROFONO DE PERIFONEO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	MICROFONO DE PERIFONEO INALAMBRICO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	AURICULAR ALTAVOZ: FREC. 75 HZ-20KHZ POT. ENTRADA 2X10Hw, MICROFONO: FRECUENCIA 50HZ -20KHZ, do	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	EGRAM ELECTRICO SIST. PANTALLA ELECT. MOTORIZADO C/PULSADOR A PARED DE 2.14MX2.14M FORMATC	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PROYECTOR MULTIMEDIA 1600 LUMENES, RES. 1090X1080 PARLANTE INCORP. HIBRIDA LASER/LED	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	COMPUTADORA PORTATIL, PROCES 4 NUCLEOS, RAM: 8GB (2X4GB), PANT: 15.6" LED, C/SONIDO, CAMARA V	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO -EN A3 EN RED/IMPRESORA, ESCANER, COPIADORA - LAS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PIZARRA ACRILICA 1.8M X 1.20M	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO ACCESS POINT VEL. TRANS. 300MBPS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	BANDERAS(03 UNIDADES)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	EXTINTOR PQS 2.5 GL. ANSI/UL 40°F-120°F ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	EXTINTOR , ACETATO POTACIO 2.5GAL ANSI/UL 40°F -120°F ALUMINIO 125PSI	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PATCH PANEL 24 PUERTOS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	SWITCH DE 24P PoE/24 PUERTOS G1, RAQUEABLE CAP. 12Gbps FLASH 32 MB MIN. DRAM 128 MB	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION) EN SUM	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	DORMITORIOS	do 1/5/16	do 1/5/16	n/a	
##	ALMOHADAS 1 1/2 PLAZAS DE POLIURETANO, DERIVADO ORGÁNICO TERMOPLÁSTICO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	SABANAS / FUNDA 1 1/2 PLAZAS ALGODON 100% MERCERIZADO Y SAFOROZADO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	FRAZADA DE FIBRA DE ALPACA DE 1 1/2 PLAZA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	COBERTOR 1.1/2 PLAZAS DE POLIESTER	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	COLCHONES 1 1/2 PLAZAS MAT: DERIVADO ORG. TERMOPLASTICO, ESPUMA: DURA Y RESISTENTE DE POROS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CORTINAS ENROLLABLE PARA POLIESTER 1.25X1.50 (INCL. ACC. DE FIJACION)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER 1.40X1.80 (INCL. ACC. DE FIJACION)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	TOALLAS ALGODÓN (50X60 CM)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	COCINA	do 1/5/16	do 1/5/16	n/a	
##	SARTÉN Nº 30- ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	OLLA INDUSTRIAL Nº 32 - ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	OLLA INDUSTRIAL Nº 46 - ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	TETERA 3 LITROS - ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CUCHARON Nº 15- ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	ESPÁTULA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	ESPUMADERA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PLATO TENDIDO Nº 9- LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PLATO HONDO Nº 9 - LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PLATO POSTRE Nº 8 - LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	TAZA CON PLATO 230ML - LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	JUEGO DE TAZONES(3 MEDIDAS) - LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE COCINA CON MANGO DE MADERA	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA MODELO COLA DE PATO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	AZUCARERA DE LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	PORTA PLATOS DE POLIPROPILENO DE BASE DE COLORES Y TAPA TRANSPARENTE	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	TABLA DE PICAR DE MATERIAL ACRILICO 30X22CM	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	SALERO DE LOSA BUENA CALIDAD	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	SECADORES(MANTELES) DE ALGODON 30X 50CM	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	COCINA SEMIINDUSTRIAL ALTA 03 HORNILLAS LARGO 0.90M X ANCHO 55CM X ALTO 70CM	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	REFRIGERADOR FOVOLTAICO CON KIT PANELES SOLARES INDEPENDIENTE PARA FUNCIONAMIENTO 24 HOR/	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	OFICINA 2	do 1/5/16	do 1/5/16	n/a	
##	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA INC. KIT DE MEDICAMENTOS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CAMILLA POLIETILENO, C/CARRIL DE ACERO INOXIDABLE LARGO 2.15M X ANCHO 0.61M PROFUND. 0.19 M.	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	HERRAMIENTAS	do 1/5/16	lu 2/5/16	n/a	
##	RECOGEDORES DE PLASTICO CON MANGO LARGO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	
##	BALDE ESCURRIDOR DE PLASTICO GRANDE	do 1/5/16	do 1/5/16	0%	

##	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (25 LITROS) 35CMX42CMX69CM	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%
##	PAPELERAS BASCULANTE DE POLIETILENO (75 LITROS) CON PARANTES METALICOS Ø 2"	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	CAJA DE HERRAMIENTAS 23" C/BROCHES METALICOS Y TAPA DE CAUCHO (INCL. HERRAMIENTAS)	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	CARRETILLA DE UNA RUEDA 3PIES CUBICOS CON TOLVA DE PLANCHA DE ACERO AL CARBONO SAE 1010 LAI	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	ESCOBA SINTETICA DE 12" CON CERDAS DE PVC	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	TRAPEADOR CON MOPA PLANA CON MICROFIBRA 35 CM Y MANGO DE ALUMINIO	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	PICO DE ACERO AL CARBONO SAE 1045,CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANG	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	PALA DE ACERO AL CARBONO SAE 1045,CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANC	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	LINTERNAS RECUBIERTA DE PLASTICO 15CM INTENSIDAD DE LA LUZ: 300 LUX.	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	SUPRESOR DE PICOS GRANDE SUJECION 775V DE 6 SALIDAS CON PROTECTOR DE PICO VOLTAJE 200V DE 3.0	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	MANGUERA 3/4" DE POLIETILENO REFORZADO ROLLO DE 100M	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (10.7 LITROS) 25.9CMX18.4CMX36.5CM	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	<b>SANITARIAS</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK MODELO A1E-0.6M CON APAGADO AUTOMATICO	do 1/5/16	ma 3/5/16	1%
##	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 150LTS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 50LTS	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	<b>ELECTRICOS</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	n/a
##	UPS TIPO TOWER POT. MIN. 2500 VA Ventrada=100-240V Vsalida= 220VAC, 10 MINUTOS AUTONOMIA C/PL	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%
##	GABINETE DE COMUNICACIONES 18 RU DE ACERO FRIO NEGRO TEXTURIZADO P/SISTEMA DE DATA	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%
##	GENERADOR ELECTRICO 8HP 6kW prime 7.5kVA MONOFASICO 220V, 60HZ, 4T-REFRIGERADO POR AIRE CIL.	do 1/5/16	lu 2/5/16	0%
##	POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS LED 65 W C/BATERIA 100AH Y CONTROLADOR CARGA (inc. instalacion)	vi 29/4/16	ma 3/5/16	1%
##	ESTUFA TERMORADIADOR DE 2000 W DE POTENCIA	sá 30/4/16	sá 30/4/16	0%
##	<b>MOVILIDAD</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	n/a
##	MOTO LINEAL CLIN. 124CC -140CC, 4 T, MONOCILINDRICO, OHC, POT. MAX. 11.13HP@7,000 RPM -12.0HP@	do 1/5/16	do 1/5/16	0%
##	CULMINACION DE LA OBRA	ma 3/5/16	ma 3/5/16	1%

